

OPÓŹNIENIA W STOSUNKU DO PROGRAMU NR 13

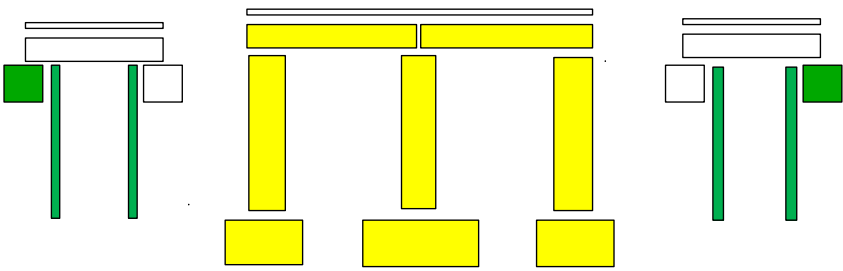
2017-09-30

WD-32	41+190 00	
-------	-----------	--

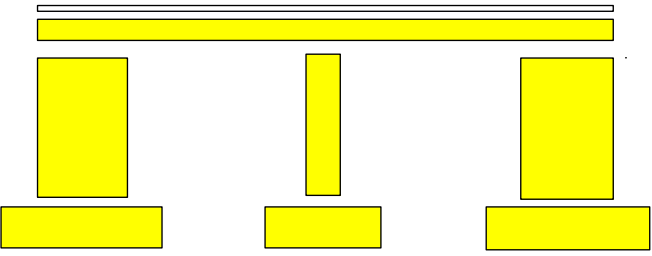
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1630	Izolacja gruba jednowarstwowa	4-10-2016	361
1633	Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolane	22-11-2016	312
1652	Krawężnik kamienny 20x30 za obiektem	29-11-2016	305

WD-33	41+743 70	
-------	-----------	--

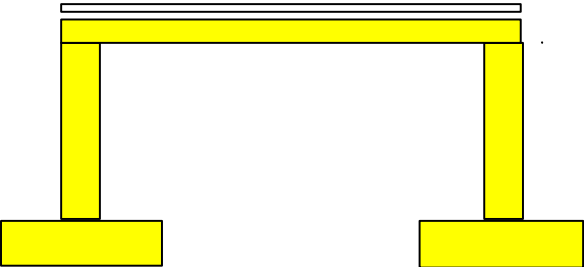
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	
1697	Izolacja gruba jednowarstwowa	7-10-2016	358
1699	Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolane	18-04-2017	165
1722	Krawężnik kamienny 20x30 za obiektem	7-12-2016	297

PE-10	42+179 50	
-------	-----------	--

ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	
1736	Beton ustroju nośnego B40 (C40/50)	30-06-2017	92
1755	Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednow	31-07-2017	61

WA-1	47+142 56	
------	-----------	---

ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	
2206	Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednow	31-10-2016	334
2219	Dylatacja modułowa ±90mm	25-03-2017	189
2220	Dylatacja modułowa ±30mm	24-03-2017	190

PG-1	47+247 80		
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	
2255	Umocnienie skarp geokratą polimerową	13-03-2017	201
2257	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzch	3-03-2017	211

WA-2	47+470 95		
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	
2269	Zbrojenie stalą klasy A-IIIN	26-07-2017	66
2277	Beton ustroju nośnego B45 (C35/45)	21-06-2017	101
2303	Urządzenia dylatacyjne	4-04-2017	179

Legenda:



roboty zakończone



roboty w toku



roboty nierozpoczęte
