




OPÓŹNIENIA W STOSUNKU DO PROGRAMU NR 13

WD-25A	33+496,00	
--------	-----------	--

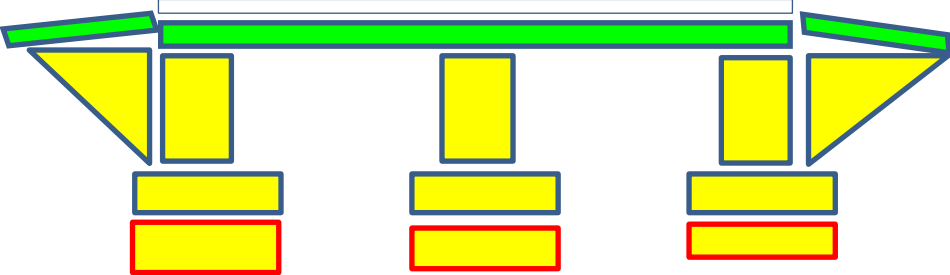
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
897	Beton kap chodnikowych	2017-05-04	149
925	Krawężnik mostowy kamienny	2017-04-10	173
910	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-05-30	123

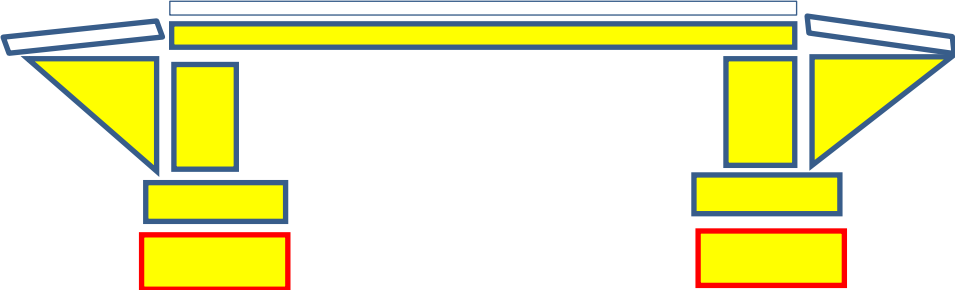
WD-25 B	0+227,46	
---------	----------	---

ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
977	Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych	2016-08-20	406

WD-25 C	0+163,22			
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opozninia - stan na 30.09.2017	
1038	Nawierzchnia jezdni z SMA	2016-08-23	403,00	
1062	Ekran przeciwoślńieniowe	2016-07-29	428,00	

WD-26	34+056,79		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opozninia - stan na 30.09.2017
1093	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-06-30	92
WD-27	35+090,47		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opozninia - stan na 30.09.2017
1214	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-05-20	133
1202	Beton kap chodnikowych	2016-12-19	285
1229	Krawężnik mostowy kamienny	2016-09-19	376

WD-28	37+065,67			
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017	
1275	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-02-06	236	
1290	Krawężnik mostowy kamienny	2016-07-01	456	

WD-29 A	37+742,60			
ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017	
1336	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-04-19	164	
1322	Beton kap chodnikowych	2017-06-17	105	
1346	Dylatacja modułowa	2017-04-28	155	

WD-29 37+848,62	Jezdnia lewa			
	Jezdnia prawa			
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017	
1374	Beton płyt przejściowych	2017-07-29	63	
1376	Beton kap chodnikowych	2017-08-14	47	
1399	Dylatacja modułowa	2017-07-19	73	

WD-31+PT	39+682,36			
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017	
1559	Beton podpór	2017-06-28	94	

Legenda:



roboty zakończone



roboty w toku



roboty nierozpoczęte
