



OPÓŹNIENIA W STOSUNKU DO PROGRAMU NR 13




ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1137	Beton płyt przejściowych	2016-12-19	285
1141	Beton kap	2017-04-24	159
1169	Urządzenia dylatacyjne	2017-03-16	198

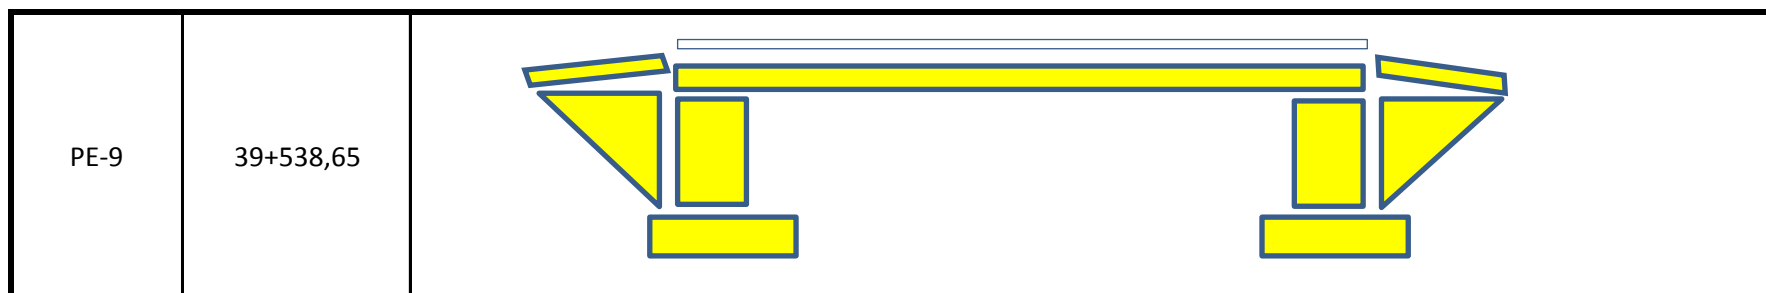


ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1502	Beton kap	2017-03-16	198
1529	Urządzenia dylatacyjne	2017-03-13	201
1517	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-04-29	154

PE-11	43+203,00		
-------	-----------	--	--


ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1797	Beton kap	2017-06-12	110
1824	Urządzenia dylatacyjne	2017-06-12	110
1812	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-07-04	88

PE-11A	2+253,33 DO		
--------	-------------	---	--



ID.	Zakres prac	Data wykonania zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1895	Ekran przeciwoślśniowe	2017-05-02	151

PE-11B	1+674,41 DO		
--------	-------------	--	--

ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1937	Urządzenia dylatacyjne	2017-03-07	207
1928	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-05-01	152
1949	Ekrany przeciwoślńieniowe	2017-04-07	176

PE-12	44+708,00		
-------	-----------	---	--

ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1972	Montaż belek typu "T"	2017-05-09	144
1966	Beton ustroju nośnego	2017-06-22	100
2011	Ekrany przeciwoślńieniowe	2017-07-06	86

PE-12A	3+778,46 DO		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
2066	Ekrany przeciwoślśniowe	2017-05-10	143
PE-12B	3+167,39 DO		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
2108	Urządzenia dylatacyjne	2017-03-01	213
2099	Nawierzchnia jezdni z SMA	2017-04-17	166
2120	Ekrany przeciwoślśniowe	2017-05-19	134

WD-30	38+631,84		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
1439	Beton kap	2016-11-30	304
1469	Urządzenia dylatacyjne	2017-03-13	201
WD-30A	45+660,64		
ID.	Zakres prac	Data wykonia zgodnie z Programem nr 13	Ilość dni opóźnienia - stan na 30.09.2017
2136	Beton ustroju nośnego	2017-05-10	143
2160	Urządzenia dylatacyjne	2017-06-19	103

Legenda:



roboty zakończone



roboty w toku



roboty nierozpoczęte
